

Comune di Ferno

Provincia di Varese

CRONOPROGRAMMA


OGGETTO: LAVORI DI " RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO POSTA AL PIANO SEMINTERRATO/TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO GRADO "ISTITUTO COMPRENSIVO B. CROCE" VIA MARCO POLO N.9 A FERNO (VA) -CUP I19E20000600004" -

COMMITTENTE: Comune di Ferno via Aldo Moro n°3, 21010 Ferno (VA) - C.F. / P.IVA 00237790126

Ferno, 15/05/2020

Il Tecnico
(Ing. Gesualdi Vincenzo)

ID	Nome attività	Durata	Importo	luglio 2020														agosto 2020					
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01
1	Allestimento del cantiere, scarico dell'impianto, risanamento chimico impia	4 g	3'894,93	█																			
2	Rimozione tubazioni esistenti, scollegamenti elettrici, posa pompa	1 g	4'805,00													█							
3	Fornitura e posa di impianto riscaldamento e sostegni	11 g	25'173,52	█																			
4	Forometrie e ripristino murature (opere edili)	3 g	1'768,32													█							
5	Fornitura e posa di valvole, detentori, valvole termostatiche	10 g	5'328,20													█				█			

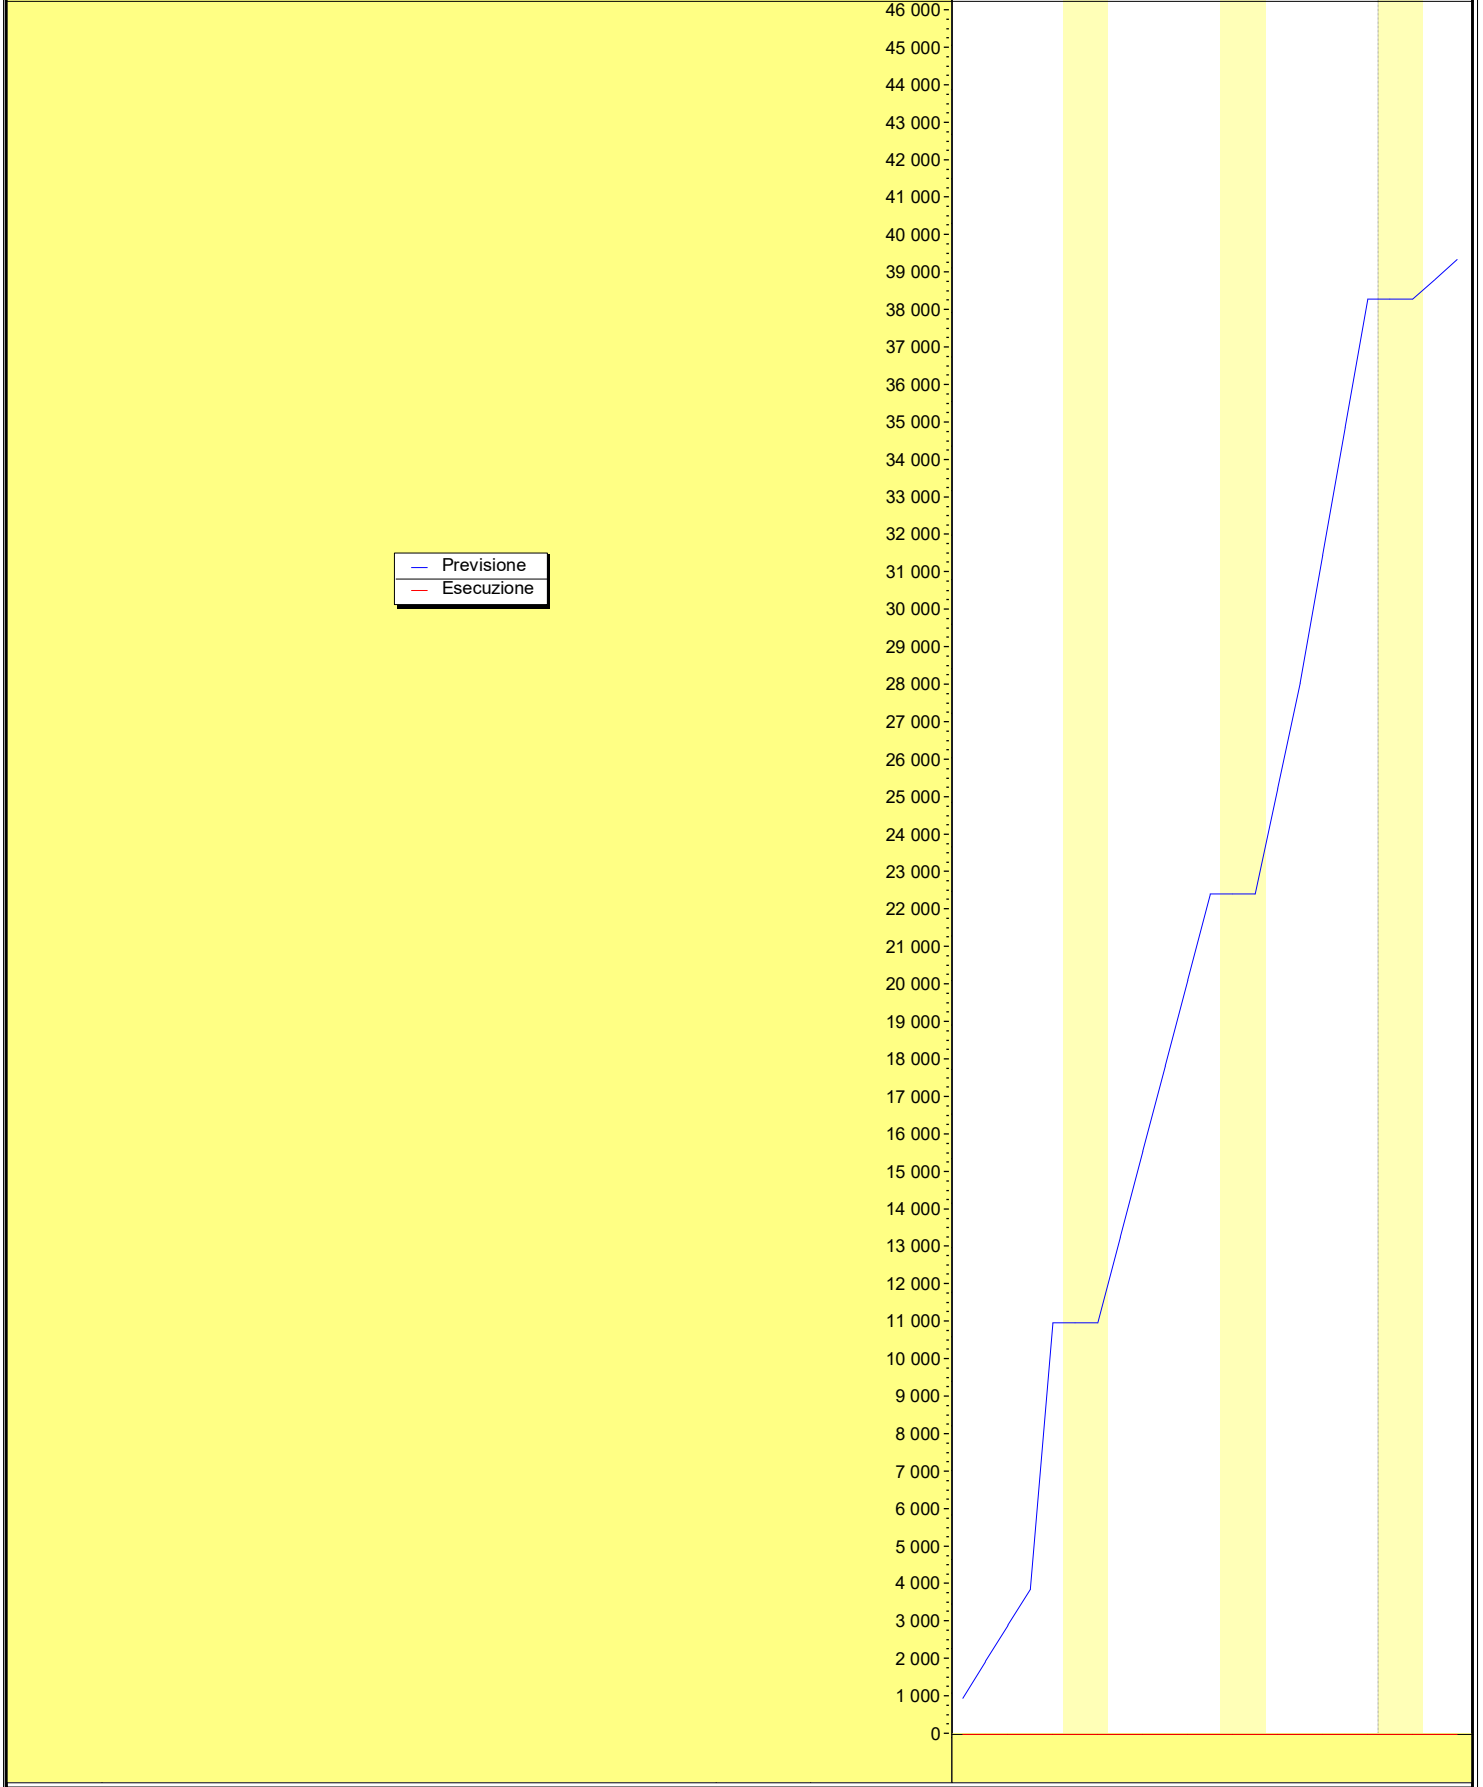

Comune di Ferno

Provincia di Varese

Tabella Attività

OGGETTO: LAVORI DI " RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO POSTA AL PIANO SEMINTERRATO/TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO GRADO "ISTITUTO COMPRENSIVO B. CROCE" VIA MARCO POLO N.9 A FERNO (VA) -CUP I19E20000600004" -

COMMITTENTE: Comune di Ferno via Aldo Moro n°3, 21010 Ferno (VA) - C.F. / P.IVA 00237790126

Ferno, 15/05/2020

Il Tecnico
(Ing. Gesualdi Vincenzo)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Allestimento del cantiere, scarico dell'impianto, risanamento chimico impianto	3'894,93	9,51	13/07/2020	16/07/2020	4	4
Rimozione tubazioni esistenti, scollegamenti elettrici, posa pompa	4'805,00	11,73	17/07/2020	17/07/2020	1	1
Fornitura e posa di impianto riscaldamento e sostegni	25'173,52	61,44	17/07/2020	31/07/2020	11	15
Forometrie e ripristino murature (opere edili)	1'768,32	4,32	29/07/2020	31/07/2020	3	3
Fornitura e posa di valvole, detentori, valvole termostatiche	5'328,20	13,01	27/07/2020	07/08/2020	10	12
Ferno, 15/05/2020						
il Tecnico Ing. Gesualdi Vincenzo						

Comune di Ferno

Provincia di Varese

Tabella Date e Importi

OGGETTO: LAVORI DI " RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO POSTA AL PIANO SEMINTERRATO/TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO GRADO "ISTITUTO COMPRENSIVO B. CROCE" VIA MARCO POLO N.9 A FERNO (VA) -CUP I19E20000600004" -

COMMITTENTE: Comune di Ferno via Aldo Moro n°3, 21010 Ferno (VA) - C.F. / P.IVA 00237790126

Ferno, 15/05/2020

Il Tecnico
(Ing. Gesualdi Vincenzo)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
13/07/2020	973,73	973,73	2,38
14/07/2020	973,73	1'947,47	4,75
15/07/2020	973,73	2'921,20	7,13
16/07/2020	973,73	3'894,93	9,51
17/07/2020	7'093,50	10'988,43	26,82
20/07/2020	2'288,50	13'276,93	32,41
21/07/2020	2'288,50	15'565,44	37,99
22/07/2020	2'288,50	17'853,94	43,58
23/07/2020	2'288,50	20'142,44	49,16
24/07/2020	2'288,50	22'430,94	54,75
27/07/2020	2'821,32	25'252,26	61,64
28/07/2020	2'821,32	28'073,58	68,52
29/07/2020	3'410,76	31'484,35	76,85
30/07/2020	3'410,76	34'895,11	85,17
31/07/2020	3'410,76	38'305,87	93,50
03/08/2020	532,82	38'838,69	94,80
04/08/2020	532,82	39'371,51	96,10
05/08/2020	532,82	39'904,33	97,40
06/08/2020	532,82	40'437,15	98,70
07/08/2020	532,82	40'969,97	100,00
Ferno, 15/05/2020			
il Tecnico Ing. Gesualdi Vincenzo			
